PIANTA VASCA IN4
Scala 1:75

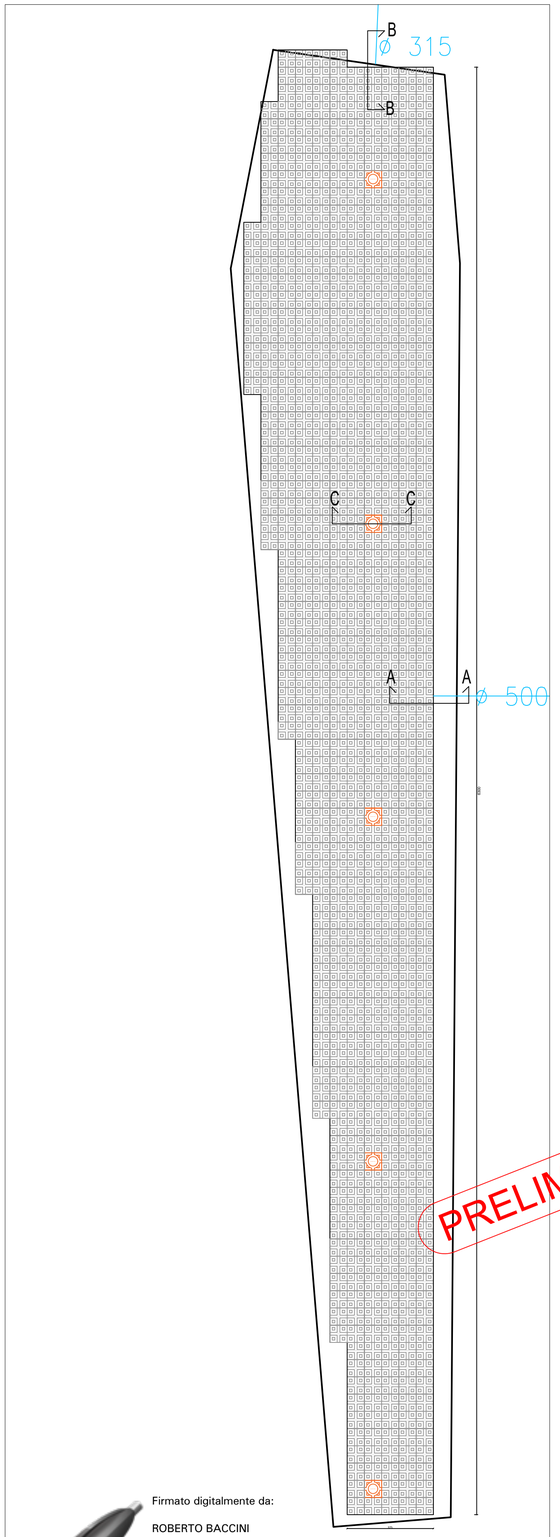

PIANTA VASCA IN4
Scala 1:75

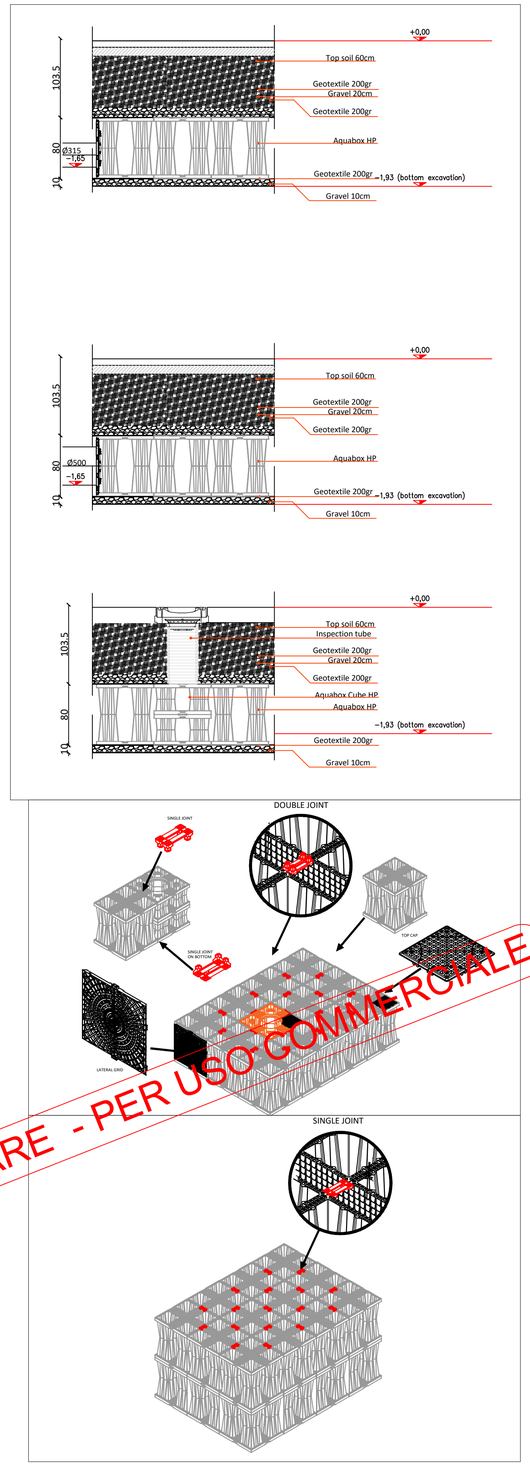

VASCA DI LAMINAZIONE IN4
AQUABOX TANK BOQ

Volume netto accumulo	=	294m3
Aquabox	=	1346 pcs
Chiusura superiore	=	2728 pcs
Griglia laterale	=	192pcs
Aquabox cube	=	20 pcs
Coperchio D4	=	5 pcs
Aggancio singolo	=	2604 pcs
Aggancio doppio	=	\
Griglia laterale cube	=	\
Geotessile	=	1060m2

IN4 AQUABOX

Parametri CPP					Superficie	9851,00	m2
a	69,28	mm			Coefficiente di deflusso	0,94	
n	0,3175				Superficie scolante	9291,96	m2
t	h	V in	V out	diff	Calcolo Volume di laminazione		
h	mm	mc	mc	mc	Altezza	0,8	m
0	0	0	0	0	Perimetro	144	m
0,02	20,0	185,9	10	176,2	Superifice lat infiltrazione	115,20	m2
0,04	24,9	231,7	19	212,2	Superficie fondo infiltrazione	383	m2
0,06	28,4	263,5	29	234,3	Velocità infiltrazione suolo	4,32E-04	m/s
0,08	31,1	288,7	39	249,8	Cadente piezometrica	1,255	
0,10	33,4	309,9	49	261,3	Portata infiltrazione	0,13505	m3/s
0,20	41,6	386,2	97	288,9	Portata infiltrazione	135,05	l/s
0,30	47,3	439,2	146	293,4	V lam	293,4	m3
0,40	51,8	481,2	194	286,8			
0,50	55,6	516,6	243	273,5			
0,60	58,9	547,4	292	255,7			
0,70	61,9	574,8	340	234,5			
0,80	64,5	599,7	389	210,8			
0,90	67,0	622,6	438	185,0			

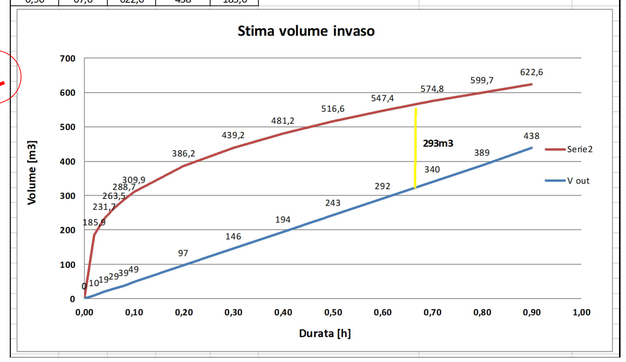

PIANTA GENERALE
Scala 1:75

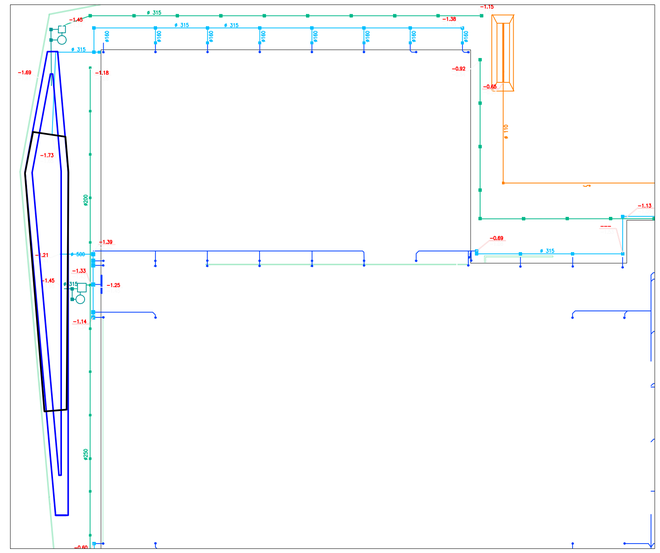

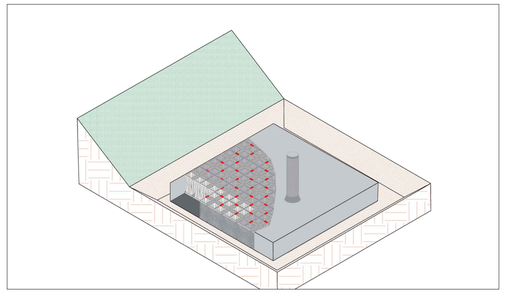

PRELIMINARE - PER USO COMMERCIALE

Firmato digitalmente da:
ROBERTO BACCINI
Noovle S.p.A.
Firmato il 26/08/2025 18:43
Seriale Certificato: 2346
Valido dal 23/07/2024 al 23/07/2027
TI Trust Technologies QTSP CA

GEOPLAST S.P.A.
via Martiri della Libertà 6\8 - 35010 Grantorto (Padova) ITALIA
Tel.: +39 049 949 0289 - e-mail: ufficiotecnico@geoplastglobal.com
https://www.geoplastglobal.com

PROGETTO | PROJECT
preventivo Santo Stefano Ticino

CLIENTE | CUSTOMER
AMBIENTE SPA Consulting & Engineering

PRODOTTO | PRODUCT	CONTENUTO ELABORATO| OBJECT	CODICE UT | T.O. CODE
AQUABOX	**DISPOSITION**	**553ITTAAMB22**

RESP. PROG.| P.M.	DATA CREAZIONE| DATE	SCALA | SCALE	UNIT. | UN.
FM	**16/06/2022**	**VAR.**	

IND.	DATA	DESCR. | OBJ.	AUT. | AUTH.	CONT. | CK BY
0	16/06/2022	1A EMISSIONE	FM	FM

CODIFICA DISEGNO | DRAW CODE#

Prog. n.	Tipologia | Obj.	Fase	Tavola	Rev.
553 22	NNE D	P	0	0

Timbro & Firma | Signature

PREGO FARE ATTENZIONE: il nostro servizio per lo sviluppo di progetti e per il calcolo dei prodotti è completamente gratuito, deve essere considerato come un'indicazione. Le quantità calcolate devono essere verificate dal cliente prima della conferma dell'ordine. Geoplast S.p.A. rifiuta ogni responsabilità per eventuali differenze, per eccesso o per difetto, connesse alla quantità necessaria per terminare il lavoro nel cantiere. Si prega di considerare che non accettiamo resi per merci eccedenti e, se alcuni beni sono mancanti, saranno venduti secondo le consuete condizioni di vendita e con i normali costi di spedizione.
